



CIO 9 octobre 2015

Point d'avancement du Schéma Directeur SI

Pilotage et Rationalisation

Qualité des services – Qualité des données


09/10/2015

CIO Point d'avancement SDSI

1

Schéma Directeur du SI

- Validation juillet 2014
- 32 projets de transformation du SI
18 P1 – 11 P2 – 3 P3
- Janvier 2014 – Décembre 2018
- 7 projets transverses
- 10 directions pilote

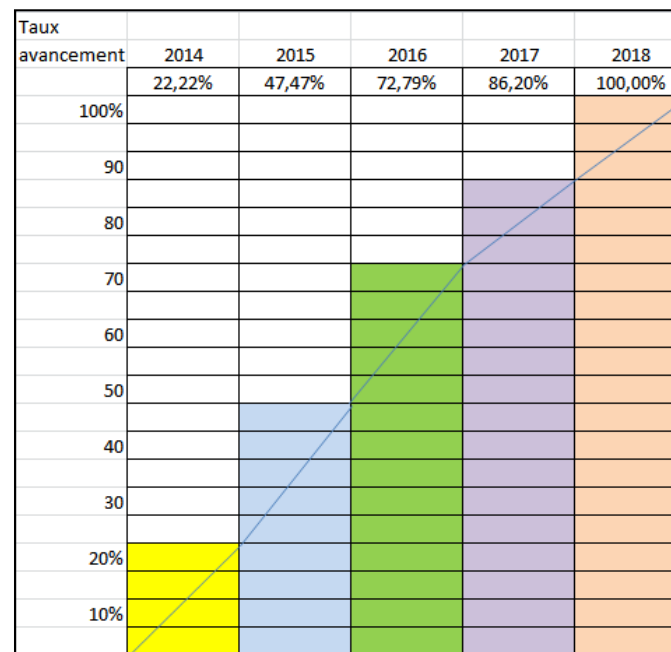

PRES	Présidence	BIB	Bibliothèque	DFC		DIL		UFE
DGS	D. G. Services	COM	D. Communication	OID		DRH		SRCV

SDSI - Les directions pilotes 1

SDSI OCTOBRE 2015	DIRECTIONS PILOTE DIRECTIONS IMPACTEES (x)																	
REF	PROJET	Direction Pilote	Priorit	Etat	DFC	DRH	DIL	COM	BIB	SRCY	UFE	SCO	LABOS	DIO	PRES	DGS	Avancement	
SDSI-01	SIFAC/GBCP	DFC	P1	En cours	DFC												17%	
SDSI-02	Migration de la paie	DRH	P1	Fait	x	DRH											100%	
SDSI-03	Tableaux de bord de Sifac avec Business Object	DFC	P1	En cours	DFC		x	x	x		x		x	x	x	x	50%	
SDSI-04	Tableaux de bord DRH	DRH	P1	A faire		DRH											0%	
SDSI-05	Intégration paie à la gestion du personnel	DRH	P1	A faire		DRH											0%	
SDSI-06	Référentiel Personnes	DIO	P1	En cours		x	x		x		x	x	x	DIO	x		14%	
SDSI-07	Réservation de salles	DIL	P1	Fait			DIL										100%	
SDSI-08	Suivi des interventions DIL	DIL	P1	En cours			DIL										50%	
SDSI-09	Refacturation	DIL	P2	A faire	x		DIL									x	0%	
SDSI-10	Carnets de bord	DIL	P3	A faire			DIL										0%	
SDSI-11	Outils de gestion du patrimoine	DIL	P3	A faire			DIL										0%	
SDSI-12	Outils de gestion sécurité	DIL	P2	A faire			DIL										0%	
SDSI-13	Projet photothèque	BIB	P2	A faire					BIB								0%	
SDSI-14	POP	BIB	P1	En cours					BIB				x				70%	
SDSI-15	Bibliothèque numérique	BIB	P1	En cours					BIB								44%	
SDSI-16	SIGB Koha	BIB	P1	En cours					BIB								35%	

SDSI - Les directions pilotes 2

SDSI OCTOBRE 2015	DIRECTIONS PILOTE DIRECTIONS IMPACTEES (x)																	
REF	PROJET	Direction Pilote	Priorit	Etat	DFC	DRH	DIL	COM	BIB	SRCY	UFE	SCO	LABOS	DIO	PRES	DGS	Avancement	
SDSI-17	Suivi de l'inventaire physique	DFC	P3	A faire	DFC				x		x		x	x			0%	
SDSI-18	Réservation visites, achats, inscriptions colloques et formation avec paiement en ligne	COM	P1	Fait	x			COM	x		x		x				100%	
SDSI-19	Gestion des demandes de congés et absences	DGS	P2	A faire	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	DGS	0%	
SDSI-20	Communication sur l'agenda partagé	DIO	P2	A faire	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DIO	x	x	0%	
SDSI-21	Travail collaboratif en temps réel	COM	P2	A faire	x	x	x	COM	x	x	x	x	x	x	x	x	0%	
SDSI-22	Evolution de l'intranet	PRES	P1	En cours	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRES	x	40%	
SDSI-23	Serveur CAS	DIO	P2	A faire										DIO			0%	
SDSI-24	Refonte de l'annuaire LDAP	DIO	P1	En cours							x		x	DIO			43%	
SDSI-25	Préférentiel des machines connectées (base IP)	DIO	P2	En cours							x		x	DIO			50%	
SDSI-26	Téléphonie sur IP	DIO	P1	En cours			x							DIO			11%	
SDSI-27	ENT	UFE	P1	En cours							UFE						64%	
SDSI-28	Application enseignants - Tableaux de service	UFE	P1	En cours							UFE						67%	
SDSI-29	Application étudiants	UFE	P2	A faire							UFE	x				x	0%	
SDSI-30	Suivi des contrats	SRCY	P1	En cours	x					SRCY			x				17%	
SDSI-31	Suivi des feuilles de temps	SRCY	P2	A faire						SRCY							0%	
SDSI-32	Archivage	BIB	P2	En cours	x	x	x	x	BIB	x	x	x	x	x	x	x	24%	

Priorités et Planning prévisionnel 1

		Direction Pilote	ETAT du PROJET	Priorité	2015				2016				2017				2018				durée mois	fait mois	réalisé %
					oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept			
SDSI-01	SIFAC/GBCP	DFC	En cours	P1																	18	3	17%
SDSI-02	Migration de la paie	DRH	Fait	P1																	6	6	100%
SDSI-03	Tableaux de bord d	DFC	En cours	P1																	12	6	50%
SDSI-04	Tableaux de bord D	DRH	A faire	P1																	12	0	0%
SDSI-05	Intégration paie à la	DRH	A faire	P1																	27	0	0%
SDSI-06	Référentiel Personne	DIO	En cours	P1																	21	3	14%
SDSI-07	Réservation de salle	DIL	Fait	P1																	6	6	100%
SDSI-08	Suivi des interventio	DIL	En cours	P1																	18	9	50%
SDSI-09	Refacturation	DIL	A faire	P2																	6	0	0%
SDSI-10	Carnets de bord	DIL	A faire	P3																	6	0	0%
SDSI-11	Outils de gestion du	DIL	A faire	P3																	24	0	0%
SDSI-12	Outils de gestion se	DIL	A faire	P2																	15	0	0%
SDSI-13	Projet photothèque	BIB	A faire	P2																	36	0	0%
SDSI-14	POP	BIB	En cours	P1																	30	21	70%
SDSI-15	Bibliothèque numé	BIB	En cours	P1																	48	21	44%
SDSI-16	SIGB Koha	BIB	En cours	P1																	60	21	35%

Priorités et Planning prévisionnel 2

		Direction Pilote	ETAT du PROJET	Priorité	2015				2016				2017				2018				durée mois	fait mois	réalisé %
					oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept			
SDSI-17	Suivi de l'inventaire	DFC	A faire	P3																	12	0	0%
SDSI-18	Réservation visites	COM	Fait	P1																	3	3	100%
SDSI-19	Gestion des deman	DGS	A faire	P2																	12	0	0%
SDSI-20	Communication sur	DIO	A faire	P2																	6	0	0%
SDSI-21	Travail collaboratif	COM	A faire	P2																	24	0	0%
SDSI-22	Evolution de l'intran	PRES	En cours	P1																	15	6	40%
SDSI-23	Serveur CAS	DIO	A faire	P2																	15	0	0%
SDSI-24	Refonte de l'annua	DIO	En cours	P1																	21	9	43%
SDSI-25	Référentiel des mac	DIO	En cours	P2																	18	9	50%
SDSI-26	Téléphonie sur IP	DIO	En cours	P1																	27	3	11%
SDSI-27	ENT	UFE	En cours	P1																	33	21	64%
SDSI-28	Application enseig	UFE	En cours	P1																	27	18	67%
SDSI-29	Application étudian	UFE	A faire	P1																	27	0	0%
SDSI-30	Suivi des contrats	SRCV	En cours	P1																	18	3	17%
SDSI-31	Suivi des feuilles de	SRCV	A faire	P2																	15	0	0%
SDSI-32	Archivage	BIB	En cours	P2																	51	12	24%

Lotissement des projets DIO

09/10/2015

CIO Point d'avancement SDSI

∞

			Direction Pilote	ETAT du PROJET	Priorité	2014				2015				2016				2017				2018				durée mois	fait mois	réalisé %
						janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc	janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-déc			
SDSI-23		Serveur CAS	DIO	A faire	P2																					15	0	0%
SDSI-24		Refonte de l'annuaire	DIO	En cours	P1																					21	9	43%
	SDSI-24.1	maquette nouvel ar	DIO	Fait																						9	9	100%
	SDSI-24.2	recueil des besoins	DIO	A faire																						3	0	0%
	SDSI-24.3	arrêt progressif du k	DIO	A faire																						9	0	0%
SDSI-25		Référentiel des mac	DIO	En cours	P2																					18	9	50%
	SDSI-25.1	Référentiel des mac	DIO	Fait																						9	9	100%
	SDSI-25.2	Référentiel des mac	DIO	A faire																						3	0	0%
	SDSI-25.3	Référentiel des mac	DIO	A faire																						6	0	0%
SDSI-26		Téléphonie sur IP	DIO	En cours	P1																					27	3	11%
	SDSI-26.1	Etude préparatoire	DIO	Fait																						3	3	100%
	SDSI-26.2	Marchés	DIO	A faire																						6	0	0%
	SDSI-26.3	Deploiement DIO P	DIO	A faire																						3	0	0%
	SDSI-26.4	Deploiement site P	DIO	A faire																						6	0	0%
	SDSI-26.5	Deploiement site M	DIO	A faire																						6	0	0%
	SDSI-26.6	Deploiement site N	DIO	A faire																						3	0	0%

La suite SDSI

Compléter chaque fiche projet :

- Acteurs métier – Acteurs techniques
- Ressources estimées (budget - ETP)
- Planification des activités

Comitologie

- Comités de suivi et d'arbitrage (direction métier et établissement)
- Groupes de travail (projets transverses)
